

SEM 软件工程管理说明

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的软件工程管理说明（SEM），覆盖项目范围、计划、组织分工、软件过程监控与控制、质量保证、配置管理、风险管理、沟通管理、变更管理和最终交付管理。文档从工程管理角度说明项目如何由初始骨架、两轮分工、两次整合发展为最终可运行、可测试、可提交的系统。

目录

1	文档控制	3
2	项目范围管理	3
2.1	本期范围	3
2.2	范围排除	3
3	组织与职责	3
3.1	RACI 职责矩阵	4
4	项目计划	5
4.1	阶段划分	5
4.2	里程碑	5
5	软件过程监控与控制	5
5.1	Git 控制	5
5.2	接口控制	6

5.3	自检控制	6
5.4	过程监控闭环	6
6	质量管理	6
6.1	质量目标	6
6.2	质量保证矩阵	7
7	风险管理	7
8	配置管理	8
8.1	配置项	8
9	变更管理	8
10	交付管理	9
10.1	最终交付物	9
10.2	排除项	9
11	管理结论	9
12	补充工程管理说明	10
12.1	阶段计划与控制点	10
12.2	风险登记册	10
12.3	质量检查矩阵	11
12.4	管理控制项	12
12.5	过程证据清单	16

1 文档控制

项目	内容
文档名称	SEM 软件工程管理说明
文档版本	V2.0
管理范围	范围、计划、组织、过程控制、质量、风险、配置、沟通、交付
项目组织	四人课程项目小组
管理模式	文档先行、目录分工、两轮任务、集中整合、最终封版

2 项目范围管理

2.1 本期范围

本期范围包括：建筑能耗样例数据、数据字典、FastAPI 后端、Vue 前端、三维楼层态势、统计分析、异常解释、工单闭环、决策报告、智能问答、外部模型配置、MCP Server、自动化测试、运行脚本和最终文档。

2.2 范围排除

不纳入本期范围的内容包括：真实传感器接入、企业级登录权限、生产数据库、高可用部署、移动端 App、长期真实节能审计和商业合同实施。范围排除的目的不是降低质量，而是在课程周期内保证核心系统闭环可以稳定完成。

3 组织与职责

表 2: 团队分工与交付物

成员	主要职责	核心交付物	集成边界
许奕	项目规划、整合、测试、文档、最终封版	README、任务说明、整合总结、最终文档、测试检查	统一接口、统一文档、最终质量控制
王天一	后端与架构	REST API、分析服务、保持 MCP Server、后端测试	API 契约稳定

成员	主要职责	核心交付物	集成边界
马源胜	数据与 AI	样例数据、数据源调研、数据字段与知识库、模型配置	口径稳定
周由	前端与集成	Vue 页面、图表、3D 风 通过 api.js 调用接口 险、前后端联调	

3.1 RACI 职责矩阵

表 3: RACI 职责矩阵

活动	许奕	王天一	马源胜	周由	说明
需求与范围	A/R	C	C	C	负责人统一范围和验收口径
后端接口	C	A/R	C	C	后端负责实现与测试
数据与知识库	C	C	A/R	C	数据负责人保证字段和知识库质量
前端页面	C	C	C	A/R	前端负责页面和交互
系统整合	A/R	C	C	C	集中整合减少冲突
测试验收	A/R	R	C	R	自动化与人工验收结合
最终文档	A/R	C	C	C	正式文档由负责人统一封版

其中 A 表示最终负责，R 表示执行负责，C 表示参与咨询。该矩阵的作用是把“谁最终负责”和“谁具体执行”分开，避免多人协作中出现职责空白。

4 项目计划

4.1 阶段划分

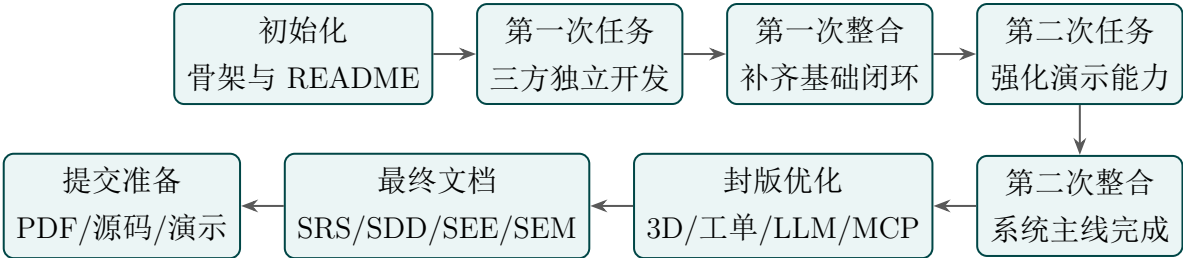


图 1: 项目阶段路径

4.2 里程碑

表 4: 主要里程碑

里程碑	完成标准	证据
M1 仓库初始化	目录结构、README、环境模板、根目录、docs/、.env.example 基础文档完成	
M2 第一次整合	后端、前端、数据 AI 初步连通	docs/11-first-integration-summary.md
M3 第二次整合	主要页面和接口可运行，功能闭环形成	docs/12-second-integration-summary.md
M4 封版优化	数据扩展、3D 联动、工单持久化、前端页面和后端测试统计分析优化	
M5 文档封版	SRS、SDD、SEE、SEM 等正式文档生成 PDF	docs/final-latex/pdf/
M6 最终提交	源码、文档、演示材料按要求整理	/

5 软件过程监控与控制

5.1 Git 控制

项目使用 GitHub 作为统一仓库。关键控制规则如下：真实 .env 不提交；每次整合前先拉取远程；整合后运行检查脚本；功能稳定后再提交；提交信息应能表达变化内容；最终提交材料排除缓存、依赖目录和个人无关作业文件。

5.2 接口控制

REST API 契约以 docs/06-api-contract.md 为基础，前端只通过 frontend/src/lib/api.js 调用接口，MCP Server 复用后端服务层。这样可以降低多人协作中“前端字段名”和“后端字段名”不一致的风险。

5.3 自检控制

项目提供 scripts/check-project.ps1 作为最终质量闸门，检查内容包括 Python 语法、后端 pytest 和前端构建。脚本失败即退出，避免出现测试失败但仍显示成功的误判。

5.4 过程监控闭环

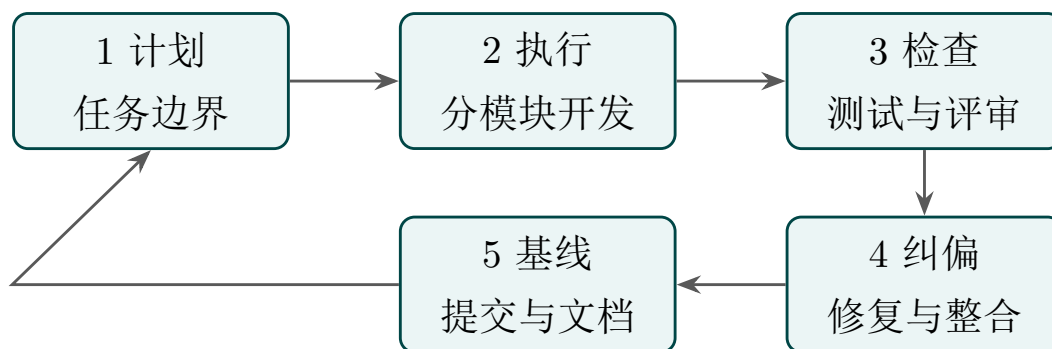


图 2: 软件过程监控与控制闭环

每轮整合均以测试通过、文档同步和安全检查作为进入下一轮的条件。该闭环强调先冻结任务边界，再执行开发、测试评审、修复整合和基线归档，避免后期反复增加范围导致提交质量失控。

6 质量管理

6.1 质量目标

1. 系统能够按 README 在普通 Windows 环境复现运行。
2. 后端接口测试、服务测试、MCP 测试和 LLM 封装测试通过。
3. 前端生产构建通过，核心页面无阻断错误。
4. 演示路径覆盖项目亮点，并能应对刷新、筛选、点击、导出和问答。
5. 最终文档使用正式口吻，面向教师评审，不包含对话式说明。
6. 最终材料不泄露真实 API Key。

6.2 质量保证矩阵

表 5: 质量保证矩阵

质量活动	检查内容	输出证据
需求审查	功能是否覆盖老师要求和演示路径	SRS、验收报告
设计审查	架构是否清晰、接口是否一致、数据是否可追溯	SDD、API 文档
代码检查	路由、服务、前端页面、脚本是否能运行	源码目录、构建结果
自动化测试	后端接口、服务、MCP、LLM 封装	pytest 结果
人工验收	浏览器操作、3D 联动、工单持久化、报告生成	测试与验收报告
安全检查	.env、API Key、运行期数据是否被排除	.gitignore、提交清单

7 风险管理

表 6: 风险登记表

风险	概率	影响	应对措施	当前状态
成员提交质量不一致	中	高	分工文件写清边界, 整合阶段统一补齐	已控制
多人合并冲突	中	中	按目录和模块分工, 减少同时改同一文件	已控制
数据量不足导致演示单薄	中	高	扩展至 2,976 条、3 月至 6 月、派生楼层设备维度	已控制
系统像写死数据	中	高	增加筛选、楼层分析、工单持久化、报告和 MCP 调用	已控制
外部模型 Key 泄露	中	高	真实 Key 仅放本地 .env, 提交前扫描	已控制
外部模型不可用	中	中	本地知识库兜底, LLM 可配置关闭	已控制

风险	概率	影响	应对措施	当前状态
MCP 依赖影响运行	低	中	requirements 声明依赖, 提供单独启动脚本和测试	已控制
PPT/视频未完成	中	中	软件侧完成, 最终提交说明列为材料项	待补充

8 配置管理

8.1 配置项

表 7: 配置项清单

类别	配置项	管理规则
源码	backend/、frontend/、scripts/	纳入 Git 管理, 提交前运行检查
数据	data/samples/、data/dictionaries/	样例数据与字典纳入仓库, 运行期数据排除
知识库	knowledge_base/	作为问答和 RAG 素材纳入仓库
环境模板	.env.example	只存占位变量, 不含真实密钥
真实环境	.env	本地私有文件, 不提交、不打包
运行状态	data/runtime/	本地生成, 不提交
最终材料	/	提交前整理源码、PDF、说明和演示材料

9 变更管理

项目后期不再进行第三轮任务分配, 而采用集中优化方式。原因是系统主链路已经形成, 继续分散开发会增加冲突和回归风险。后期变更原则为: 只接受能明显提升演示质量、文档质量或验收通过率的变更; 每次变更后检查是否影响 README、API、测试和提交材料; 涉及密钥、数据和依赖的变更必须额外检查安全性。

10 交付管理

10.1 最终交付物

最终交付应包含：源码、SRS、SDD/SDS、SEE、SEM、测试与验收报告、用户手册与部署说明、数据与接口说明、最终提交说明、PPT、演示视频或视频链接。

10.2 排除项

最终压缩包必须排除：`.env`、`frontend/node_modules/`、`frontend/dist/`、`data/runtime/`、`.pytest_cache/`、个人无关实验文件、临时日志和真实 API Key。

11 管理结论

从软件工程管理角度看，本项目已经完成范围定义、计划执行、多人分工、过程控制、质量验证、风险收敛和最终文档化。系统不需要再次分配开发任务，剩余工作集中在 PPT、视频和最终压缩包提交。项目具备最终提交条件。

12 补充工程管理说明

12.1 阶段计划与控制点

项目采用两轮任务分配加最终整合的方式推进。管理重点不是追求形式上的每日进度，而是保证每个阶段都有明确输入、输出、检查项和纠偏动作。

表 8: 阶段计划、产出与控制点

阶段	目标	主要产出	控制点
S1	项目骨架	README、目录结构、环境示例、基础文档和样例数据。	能够说明项目要做什么。
S2	第一次分工	后端、数据 AI、前端三个方向的独立任务说明。	边界清楚，减少合并冲突。
S3	第一次整合	统一接口、补齐测试、修复质量不足、形成第一版系统。	运行脚本通过。
S4	第二次分工	围绕系统完善、AI、3D、工单、不再大规模改架构。报告和文档继续细化。	
S5	第二次整合	合并成员提交，统一代码风格，补充缺失逻辑。	后端测试和前端构建通过。
S6	最终优化	扩充数据、优化 3D、工单持久化、统计分析和文档。	演示路径完整。
S7	正式文档	SRS、SDD、SEE、SEM、测试、用户手册、数据接口和提交说明。	PDF 可读且无密钥。
S8	最终交付	提交材料目录、源码副本、PDF、PPT 和视频。	按教师要求打包。

12.2 风险登记册

风险管理关注对最终提交影响最大的事项，包括运行风险、文档风险、密钥风险和协作风险。

表 9: 风险登记册

编号	风险	影响	应对措施
R-01	成员提交质量不均	接口、数据和页面可能无法直接整合。	整合者补齐缺口并用测试脚本作为质量闸门。
R-02	合并冲突	多人同时改同一文件导致返工。	任务边界按文件划分，尽量减少交叉修改。
R-03	数据量过少	演示显得像写死数据。	扩展到多建筑、多楼层、多时段。
R-04	业务逻辑单薄	教师可能认为项目只是查询页面。	增加楼层分析、设备分析、异常解释、工单闭环和报告。
R-05	外部模型不可用	问答功能演示失败。	本地知识库优先，外部模型可选。
R-06	真实密钥泄露	GitHub 公开后造成安全和费用风险。	.env 不入库，提交前模式搜索。
R-07	文档版面错误	PDF 图表重叠或表格出页影响评分。	使用 LaTeX 重写并检查 Overfull 日志和页面预览。
R-08	演示刷新丢工单	交互逻辑显得不完整。	工单写入运行期 JSON。
R-09	前端构建失败	最终源码不可复现。	提交前运行 Vite build。
R-10	后端测试失败	接口口径不可信。	pytest 作为提交前必须检查项。
R-11	PPT 与系统不一致	答辩展示和实际功能脱节。	PPT 以最终系统截图和文档为准。
R-12	压缩包结构混乱	教师难以找到正式文档和源码。	使用统一提交材料目录。
R-13	运行说明不足	同学或教师拉取后无法启动。	README 和用户手册写明完整步骤。
R-14	系统过度依赖单机状态	换机器运行时工单数据缺失。	说明运行期数据可自动生成。
R-15	图表含义不清	评审无法理解业务价值。	文档为每张图补充文字解释。
R-16	时间线不真实	课程过程材料可能与实际开发不完全一致。	最终文档聚焦工程成果和可验收内容。

12.3 质量检查矩阵

表 10: 质量检查矩阵

检查对象	检查内容	通过标准	证据
README	环境、启动、测试、密钥说明	同学按说明可运行系统。	人工复现
后端	语法、接口、服务测试	pytest 全部通过。	75 passed
前端	构建、页面加载、交互	Vite build 成功，页面可演示。	构建日志
数据	规模、字段、时间范围	覆盖 2026-03-01 至 2026-06-01。	数据字典
3D	旋转、颜色、点击联动	异常楼层跳转统计分析。	浏览器验收
工单	创建、完成、排序、持久化	刷新后状态保留。	接口和人工测试
AI 问答	本地回答、模型选择、回退	无 Key 时不阻断演示。	问答测试
MCP	工具、资源、提示词	可通过 MCP 调用项目能力。	MCP 测试
SRS	需求、用例、追踪矩阵	可说明系统范围。	PDF
SDD	架构、模块、数据、状态机	可说明实现方案。	PDF
SEE	成本、收益、定价、评价	覆盖教师经济分析要求。	PDF
SEM	范围、过程、风险、质量	覆盖工程管理要求。	PDF
安全	.env 和 Key	最终材料不包含真实密钥。	模式搜索
提交包	源码、文档、PPT、视频	结构清晰，可直接上传。	目录清单

12.4 管理控制项

以下控制项覆盖项目过程监控和最终交付管理，是从“能做出来”到“能稳定提交”的管理保证。

表 11: 管理控制项

编号	控制项	控制说明	责任输出
MC-01	任务分解	对“任务分解”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-02	成员边界	对“成员边界”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-03	第一次整合	对“第一次整合”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-04	第二次整合	对“第二次整合”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-05	最终优化	对“最终优化”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-06	接口控制	对“接口控制”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-07	数据控制	对“数据控制”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-08	代码审查	对“代码审查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-09	测试闸门	对“测试闸门”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-10	文档闸门	对“文档闸门”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-11	安全闸门	对“安全闸门”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。

编号	控制项	控制说明	责任输出
MC-12	提交闸门	对“提交闸门”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-13	风险跟踪	对“风险跟踪”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-14	变更记录	对“变更记录”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-15	沟通机制	对“沟通机制”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-16	质量目标	对“质量目标”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-17	配置管理	对“配置管理”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-18	版本管理	对“版本管理”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-19	依赖管理	对“依赖管理”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-20	运行环境	对“运行环境”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-21	演示准备	对“演示准备”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-22	PPT 协同	对“PPT 协同”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。

编号	控制项	控制说明	责任输出
MC-23	视频协同	对“视频协同”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-24	最终打包	对“最终打包”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-25	密钥排查	对“密钥排查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-26	PDF 检查	对“PDF 检查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-27	图表检查	对“图表检查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-28	表格检查	对“表格检查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-29	README 检查	对“README 检查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-30	部署检查	对“部署检查”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-31	验收路径	对“验收路径”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-32	问题记录	对“问题记录”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-33	纠偏动作	对“纠偏动作”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。

编号	控制项	控制说明	责任输出
MC-34	经验总结	对“经验总结”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。
MC-35	后续维护	对“后续维护”设置明确检查方式，发现问题后由整合者修复或协调相关同学补齐。	检查清单、提交记录或最终文档。

12.5 过程证据清单

过程证据清单用于证明项目并非只提交最终代码，而是具备需求、设计、开发、测试、经济分析、管理控制和交付整理的完整过程。

表 12: 过程证据清单

编号	证据项	说明	存放位置
PE-01	第一次任务说明	“第一次任务说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-02	第二次任务说明	“第二次任务说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-03	整合说明	“整合说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-04	接口契约	“接口契约”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-05	数据字典	“数据字典”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-06	测试计划	“测试计划”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-07	验收报告	“验收报告”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。

编号	证据项	说明	存放位置
PE-08	运行脚本	“运行脚本”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-09	环境示例	“环境示例”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-10	Git 忽略规则	“Git 忽略规则”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-11	安全检查	“安全检查”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-12	构建日志	“构建日志”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-13	测试日志	“测试日志”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-14	正式 PDF	“正式 PDF”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-15	LaTeX 源文件	“LaTeX 源文件”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-16	最终提交说明	“最终提交说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-17	演示脚本	“演示脚本”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-18	PPT 准备	“PPT 准备”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。

编号	证据项	说明	存放位置
PE-19	视频准备	“视频准备”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-20	提交目录	“提交目录”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-21	源码副本	“源码副本”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-22	Markdown 过程资料	“Markdown 过程资料”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-23	外部数据调研	“外部数据调研”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-24	大模型接入说明	“大模型接入说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-25	MCP 说明	“MCP 说明”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-26	最终 README	“最终 README”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-27	风险登记册	“风险登记册”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-28	质量矩阵	“质量矩阵”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
PE-29	变更控制	“变更控制”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。

编号	证据项	说明	存放位置
PE-30	维护建议	“维护建议”用于支撑软件工程管理过程，能够说明项目从任务分解到最终提交的演进路径。	仓库文档或提交材料目录。
